



Redegørelse Anlægs- og Renoveringsfonden 2023



Indhold

Sammenfatning	1
1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden	2
2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden	3
2.1. Bevægelser i 2023.....	3
2.2. Udvikling de sidste 10 år.....	4
2.3. Projektstatus.....	5
3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden	6
3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti.....	6
4. Økonomien for udvalgte projekter.....	8
4.1. Nye projekter i 2023	8
4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.	9
4.3 Status for de 25 største projekter	11
Bilag	15
Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti.....	15
Bilag 2: Projektstatus	23
Bilag 3: Lovgrundlag for Anlægs- og Renoveringsfonden.....	31

Sammenfatning

Anlægs- og Renoveringsfonden omfatter aktivitetsområde 80-89 i den årlige Finanslov.

Nærværende redegørelse for finanslovsåret 2023 er nr. 24 i rækken af redegørelser om bevægelserne i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Primo 2023 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 940 mio. kr. I løbet af 2023 blev der bevilget samlet 468 mio. kr. til igangværende projekter og samlet var forbruget på igangværende projekter 616 mio. kr.

Ultimo 2023 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 787 mio. kr., hvilket var en reduktion af Anlægs- og Renoveringsfonden med 153 mio. kr. fra primo samme år.

Ovenstående tal er eksklusivt udlån på nedenstående hovedkonti, og kan derfor ikke afstemmes med Landskassens regnskab.

- 20.30.07 – Boligstøtte, renter og afdrag, netto
- 87.72.17 – Boligstøtte, selvbyggerhuse
- 87.72.23 – Boligstøtte, istandsættelsestilskud
- 89.72.11 – Støttet privat boligbyggeri

Se tabel 2.1 for en opgørelse der kan afstemmes med Landskassens regnskab.

1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden

Formålet med oprettelsen af Anlægs- og Renoveringsfonden var at smidiggøre procedurerne omkring bevilling af midler til Selvstyrets bygge- og anlægsopgaver.

Selvstyret afsætter hvert år et beløb til bygge- og anlægsopgaver i Finansloven, den såkaldte anlægsramme. Anlægsrammen er sektorfordelt, hvor der inden for hver sektor foretages prioritering af konkrete bygge- og anlægsopgaver.

Anlægs- og Renoveringsfonden er en budgetteknisk fond¹, der ikke kan søges midler fra. De midler, der er registreret i fonden, sker ved vedtagelse af den årlige Finanslov samt Tillægsbevillingslov, og disse er bundet til konkrete projekter. Skal der rokeres midler fra fonden eller projekter imellem, skal dette ske ved at aflyse eller ændre et givent projekt, hvilket kræver politisk godkendelse af Inatsisartut eller Inatsisartuts Finans – og Skatteudvalg.

Departementet for Boliger og Infrastruktur varetager Selvstyrets centrale bygherrefunktion.

Den centrale bygherrefunktion er opdelt i to operative enheder, således at den overordnede planlægning og prioritering af opgaverne, budget- og økonomistyring samt bygherreadministrationen af nybyggeri varetages af Departementet for Boliger og Infrastruktur, mens renoverings-, vedligeholdelses- og nedrivningsopgaver varetages fra Renoveringsstyrelsen.

¹ Se bilag 3 Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, kapitel 4 om finanslovs, årsbudget mv., §14-17 om anlæg, renovering mv.

2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden

2.1. Bevægelser i 2023

Tallene i nærværende redegørelse er baseret på udtræk fra Selvstyrets økonomisystem og er identiske med de tal der registreres i Landskassens regnskab. Tabel 2.1 viser opgørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden i 2023 hvor "Total for redegørelsen" kan afstemmes direkte med Landskassens regnskab.

Tabel 2.1 - Opgørelse af A&R fonden 2023 (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	Primo 2023	Bevilling 2023	Forbrug 2023	Ændring 2023	Ultimo 2023
Lukkede projekter	0	316.691	-318.264	-1.573	-1.573
Projekter til intern revision	8.701	3.600	3.118	6.718	15.419
Igangværende projekter	-948.487	-468.200	616.091	147.891	-800.596
Total for redegørelsen	-939.785	-147.909	300.945	153.036	-786.749
Midlertidige poster	9.312	0	-9.854	-9.854	-542
Subtotal	-930.473	-147.909	291.091	143.182	-787.291
Hovedkonto 20.30.07	-9.027	0	0	0	-9.027
Hovedkonto 87.72.17	-7	0	0	0	-7
Hovedkonto 87.72.23	-10.851	-0	-676	-676	-11.527
Hovedkonto 89.72.11	13.341	-6.970	-41	-7.011	6.330
I alt	-937.017	-154.879	290.374	135.495	801.522

Redegørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden (A&R fonden) dækker fra 2010 ikke *hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri*. Fra 2016 dækker redegørelsen ikke *hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto*. Fra 2019 dækker redegørelsen ikke *hovedkonto 87.72.17 Boligstøtte, selvbyggerhuse og hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud*.

Disse hovedkonti er kun medtaget for at redegørelsen kan afstemmes med Landskassens regnskab. Alle disse hovedkonti omfatter udlånsager.

De midlertidige poster, som fremgår i redegørelsen for 2022 er blevet bogført på plads i første halvdel af 2023. Der var tale om poster, som var bogført udenom anlægsmodulet i Selvstyrets økonomisystem. Opsætningen er ændret, så det fremadrettet ikke er muligt at lave tilsvarende bogføring på aktivitetsområde 80-89.

Primo 2023 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 940 mio. kr. eksklusiv de fire nævnte hovedkonti.


I 2023, blev der bevilget samlet 468 mio. kr. og samlet forbrug var 616 mio. kr. på igangværende projekter.

Ultimo 2023 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning dermed 787 mio. kr., hvilket var en reducere af fonden med samlet 153 mio. kr.


2.2. Udvikling de sidste 10 år

Bevillingerne igennem 2023 udgjorde samlet 468 mio. kr., mens forbruget udgjorde samlet 616 mio. kr. på igangværende projekter. Samlet er indestående i Anlægs- og Renoveringsfonden reduceret med 153 mio. kr.

Den historiske udvikling kan aflæses af de nedenstående figurer.

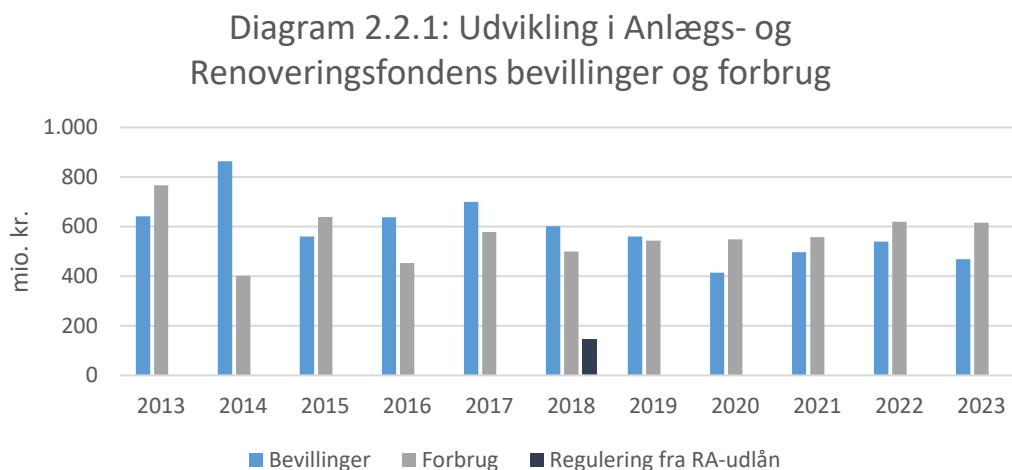

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

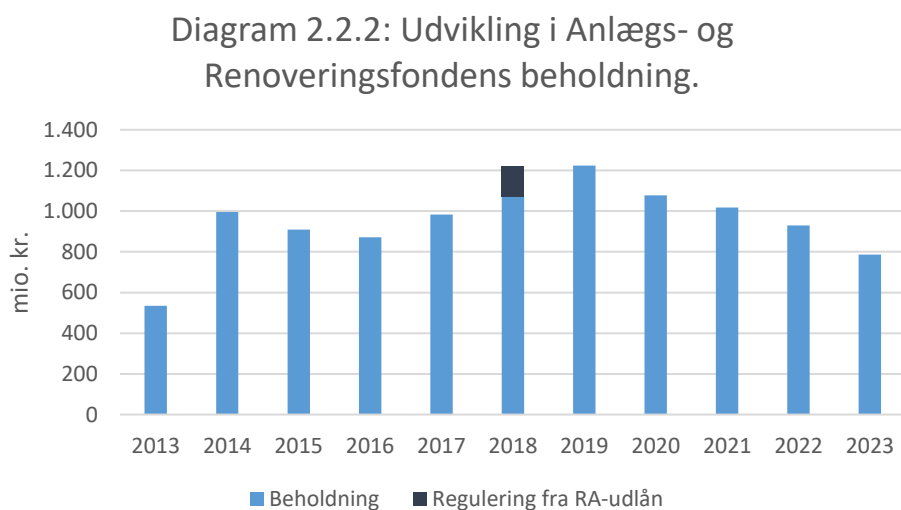

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

Alle tal er opgjort eksklusivt hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri, hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto, hovedkonto 87.72.17 Boligstøtte, selvbyggerhuse og hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med Landskassens regnskab.

2.3. Projektstatus

I løbet af 2023 er der oprettet 9 nye projekter, 211 projekter er åbne, 12 projekter blev lukket. Herudover var der 59 i lukningsproces hos Intern Revision.

Projekternes status beskrevet i tabel 2.3 herunder. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 2.3: Projektstatus

Projektstatus	Antal projekter
Igangværende	143
<i>heraf nye</i>	9
Til intern revision	59
Åbne projekter	211
Lukket	12
Projekter i alt	223

3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden

3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti

De fem største hovedkonti (målt i disponible midler) var *hovedkonto 83.30.13 Landsdækkende institutioner, hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og erstatningsbyggeri, hovedkonto 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg, hovedkonto 86.60.01 Sundhedsvæsenet og hovedkonto 84.40.15 Kollegiebyggeri*. Se yderligere detaljer i bilag 1.

Kolonnen 'Rest til disponering' i tabel 3.1, angiver den del af projektets bevilling, der endnu ikke er indgået kontrakter på pr. 31-12-2023. Hertil skal det fremgå, at bevillingsstørrelsen tager udgangspunkt i projekternes A-overslag, hvor løbende udgifter, herunder uforudsete udgifter, administrationsomkostninger, rejseudlæg osv. inkluderes. Der disponeres til disse udgifter såfremt og når det bliver aktuelt. 'Rest til disponering' er således ikke lig med at der er ledige midler, der kan rokeres til andre formål.

Tabel 3.1: Fordeling af projekter på hovedkonti (i 1.000 kr.).

Hovedkonto	Nye projekter	Primo	Bevilling IÅ	Disponibel	Forbrug	Ultimo	Forbrug i %	Rest til disponering
011014 Reserve til ny Landstingssal		1.413		1.413		1.413		1.047
011015 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut		1.936		1.936	-2	1.934	-0 %	1.704
800001 Omrokeringsreserven		64.627	-51.200	13.427	-1.576	11.851	-12 %	13.427
800010 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden		2.513		2.513		2.513		0
811002 Renovering og ombygning Selvstyrets centrale administration		1.300		1.300		1.300		1.300
822002 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	1	8.522	8.500	17.022	-10.546	6.476	-62 %	6.107
822003 IT-systemer til socialområdet		-722	6.100	5.378	-2.987	2.390	-56 %	40
822401 Administrative systemer mv. i Skattestyrelsen		7.849	6.800	14.649	-4.755	9.894	-32 %	519
833012 Ældreinstitutioner		43.302	15.800	59.102	-8.076	51.026	-14 %	7.181
833013 Landsdækkende institutioner		70.740	-3.300	67.440	-16.171	51.268	-24 %	-23.878
833014 Hjemløseindsatser		3.900		3.900		3.900		3.900
844010 Kommunale skoler		-6.130	-27.850	-33.980	29.360	-4.621	-86 %	-194.979
844012 Uddannelsesbyggeri		18.482	-220.517	-202.035	231.360	29.324	-115 %	-243.443
844014 Kultur- og idrætsbyggeri		8.178	900	9.078	-984	8.095	-11 %	7.054
844015 Kollegiebyggeri	5	108.628	110.328	218.956	-142.134	76.822	-65 %	-194.330

844501 Kirken		0	-1.352	-1.352	1.352	0	-100 %	-1.442
855020 Turismeanlæg		14.998		14.998	-709	14.289	-5 %	-850
859001 Nye kontrolfartøjer til Grønlands Fiskerilicenskontrol		7.137		7.137	-5.308	1.829	-74 %	611
866001 Sundhedsvæsenet	1	173.407	50.500	223.907	-102.762	121.145	-46 %	-287.009
870088 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter		4.498		4.498		4.498		-11.491
871106 5-års eftersyn		665	500	1.165	-231	934	-20 %	-505
871109 Transportkommissionen - forundersøgelser		15.992	2.000	17.992	-1.443	16.549	-8 %	14.378
871110 Særlige undersøgelser på anlægsområdet			1.000	1.000		1.000		1.000
87210 Personaleboliger i Nuuk		15.793	3.500	19.293	-446	18.847	-2 %	16.765
87213 Særlig renovering		6.769		6.769	-74	6.695	-1 %	-25.141
87222 Boligprogram for bygder og yderdistrikter		-2.737		-2.737		-2.737		-40.664
87312 Reinvestering i havne og kajanlæg	1	83.974	25.200	109.174	-27.910	81.265	-26 %	55.097
87320 Udbygning af landingsbanestruktur		2.823		2.823	-2.011	811	-71 %	758
87322 GLV - landingspladser		16.274		16.274	-11.920	4.353	-73 %	-63.326
87501 Nyt skib til Pinngortaleriffik		-2.240		-2.240		-2.240		-2.256
87503 Tilskud til kommunale miljøanlæg		2.439		2.439		2.439		95
87504 Asiaq		1.600		1.600	-1.594	6	-100 %	-28
897140 Nukissiorfiit, anlægsudlån	1	0	60.000	60.000	-60.000	0	-100 %	-103.900
897212 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri		263.856	161.000	424.856	-161.376	263.480	-38 %	-531.787
Total	9	939.785	147.909	1.087.694	-300.945	786.749	-28 %	-1.594.045

4. Økonomien for udvalgte projekter

4.1. Nye projekter i 2023

Der blev oprettet 9 nye projekter i 2023. Projekternes bevillinger udgjorde i alt 181 mio. kr., svarende til ca. 39% af de samlede anlægsbevillinger i 2023. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 4.1: Nye projekter i 2023 (i 1.000 kr.)

Finanslov	Projekt	Projektitel	Bevillinger 2023	Forbrug 2023
822002	90029	Nyt Lånemodul	6.500	-1.407
844015	52120	Standard Kollegier, Ilulissat, Etape 2	12.800	-1.365
844015	52121	Standard Kollegier, Aasiaat, Etape 2	12.300	-3.194
844015	52122	Standard Kollegier, Sisimiut, Etape 2	40.900	-9.849
844015	52123	Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	6.100	-4.678
844015	52124	Standard Kollegier, Qaqortoq, Etape 2	29.600	-7.230
866001	90030	Nyt EPJ-System	2.000	
877312	24141	Havnefyr	10.400	-3.802
897140	17780	Udlån til Nukissiorfiit, 2023	60.000	-60.000
Hovedtotal			180.600	-91.525

4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.

Der var 23 åbne projekter med en samlet bevilling t.o.m. ultimo 2023 på over 50 mio. kr. Se yderligere detaljer i bilag 1-2.

Tabel 4.2: Åbne projekter over 50 mio. kr. (i 1.000 kr.).

Projektnr.	Projektitel	Hovedkonto	Bevilling t.o.m ultimo 2023	Total forbrug ultimo 2023	Rest til disponering t.o.m ultimo 2023	Ultimo
17780	Udlån til Nukissiorfiit, 2023	897140	60.000	-60.000	0	0
23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	59.735	-51.040	6.436	8.695
24116	Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	220.269	-194.213	8.990	26.056
25183	Langsigtede investeringsbehov	877322	50.000	-48.611	306	1.389
30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	79.710	-77.136	-415	2.574
30019	Funktionelle boliger, Ilulissat	897212	62.200	-59.983	-406	2.217
30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	56.900	-46.117	5.497	10.783
31037	Skimmel renovering	897212	69.200	-55.890	11.542	13.310
31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	82.400	-78.330	632	4.070
34527	Diverse renovering og sanering	897212	470.355	-327.534	80.199	142.821
39041	Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554	-110.946	-29.090	-29.392
40077	Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	65.020	-60.878	3.776	4.142
47042	Regionssygehus i Sisimiut	866001	114.178	-52.306	43.995	61.872
47051	Apparaturpuljen	866001	132.500	-101.359	31.118	31.141
47053	Vedligeholdelsesefterslæb	866001	164.900	-178.772	-13.872	-13.872
52111	32 sengepladser, Aasiaat	844015	56.100	-47.977	4.243	8.123
52112	70 sengepladser, Ilulissat	844015	59.900	-51.151	4.011	8.749

52113	72 sengepladser, Sisimiut	844015	87.850	-57.889	4.142	29.961
52114	219 sengepladser, Nuuk	844015	166.500	-215.152	-65.277	-48.652
52115	74 sengepladser, Qaqortoq	844015	66.950	-68.157	-3.029	-1.207
52118	Diverse renovering	844012	62.400	-49.923	-2.146	12.477
61003	Nyt skib til Pinnngortitaleriffik	877501	220.000	-222.240	-2.256	-2.240
90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	77.942	-77.199	743	743
Hovedtotal			2.566.563	-2.292.804	89.139	273.759

4.3 Status for de 25 største projekter

Nedenfor fremgår status for de 25 største projekter målt på samlet bevilling ultimo 2023. Her er der tale om projekter, som endnu ikke er sendt til intern revision.

Projektnr.	Projektitel	Finanslov	Bevilling t.o.m. ultimo 2023	Total forbrug ultimo 2023	Status
34527	Diverse renovering og sanering	897212	470.355	-327.534	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
24116	Reinvestering i havne og kajanlæg	877312	220.269	-194.213	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
61003*	Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	220.000	-222.240	Sidste ratebetaling er udbetalt til en deponeringskonto hos en advokat, grundet forsinkelser i aflevering af skibet. Der pågår fortsat mangeludbedning, hvorfor skibet bliver endelig afleveret i starten af 2023. Projektet bliver herefter lukket.
52114**	219 sengepladser, Nuuk	844015	166.500	-215.152	Opførelse af kollegier i Nuuk er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.
47053	Vedligeholdelseefterslæb	866001	164.900	-178.772	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
47051	Apparaturpuljen	866001	132.500	-101.359	Projektet er en puljebevilling til indkøb af apparatur til sundhedsvæsenet. Herunder indkøb for såvel fornyelse, udvidelse, reparation og vedligehold.
47042	Regionssygehus i Sisimiut	866001	114.178	-52.306	Om- og tilbygning af Sisimiut sygehus er opstartet i 2022, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin.

52113	72 sengepladser, Sisimiut	844015	87.850	-57.889	Opførelse af kollegier i Sisimiut er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
31048	Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	82.400	-78.330	Opgaven er udført og mangeludbedring afsluttet. Projektet afsluttes og lukkes i 2024.
39041***	Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554	-110.946	Opgaven er udført, og 1 års eftersynsperiode + mangeludbedring heraf er gennemført i efteråret 2021. Forinden lukning, skal der gennemføres rokering af midler der er modtaget fra Staten ifb. med tsunamien. Projektets bevilling vil herefter stemme med forbruget.
30017	Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	79.710	-77.136	Opgaven er udført, hvor der under 1 års eftersynsperiode er konstateret mangler – mangeludbedring pågår
90022	Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	77.942	-77.199	Der er tale om PRISME indkøb og implementering, som er afsluttet. Projektet afsluttes og lukkes i 2024.
31037	Skimmel renovering	897212	69.200	-55.890	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af 'smilende boliger' konceptet (totalrenovering) i Selvstyrets boliger der står i tomgang pga. skimmel. Opgaverne udbydes løbende i underhåndbud, for at imødekomme behov for beskæftigelse i branchen. Tillige kan der afholdes over bevillingen tilskud til INI A/S for udbedring af mindre skimmels opgaver.
52115****	74 sengepladser, Qaqortoq	844015	66.950	-68.157	Opførelse af kollegier i Qaqortoq er opstartet i 2021, og er afleveret i 2023 med forsinkelse. Opgaven er således under 1 års eftersynsperiode + mangeludbedring i løbet af 2024.
40077	Handicapinstitution Sungiusarfik lkinngut	833013	65.020	-60.878	Der er gennemført aflevering med mindre mangler i december 2021, og der pågår 1 års eftersynsperiode, som først afslutter i januar 2023. Lukkes i 2024.
52118	Diverse renovering	844012	62.400	-49.923	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til behov og ønsker fra uddannelsesinstitutionerne udbydes løbende.
30019	Funktionelle boliger, Ilulissat	897212	62.200	-59.983	Opførelse af 48 boliger (24 Selvstyret + 24 Avannaata Kommunia) er opstartet i 2019, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin. Selvstyret varetager bygherrerollen for hele projektet.

17780	Udlån til Nukissiorfiit, 2023	897140	60.000	-60.000	Lånet er udbetalt til Nukissiorfiit i 2023.
52112	70 sengepladser, Ilulissat	844015	59.900	-51.151	Opførelse af kollegier i Ilulissat er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
23004	Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	59.735	-51.040	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – herunder særligt rådgivningsopgaver i forbindelse med udbygning af landets infrastruktur.
30026	Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	56.900	-46.117	Opførelse af 60 boliger (20 boliger Selvstyret + 40 boliger Kommune Qeqertalik i Aasiaat er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringstermin. Selvstyret varetager bygherrerollen for hele projektet.
52111	32 sengepladser, Aasiaat	844015	56.100	-47.977	Opførelse af kollegier i Aasiaat er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
25183	Langsigtede investeringsbehov	877322	50.000	-48.611	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af opgaver – herunder særligt akutte opgaver som følge af hidtil manglende investering i landets lufthavne – baner/asfalt, bygninger, rullende materiel. Sidste opgaver er ved at blive afsluttet under Mittarfeqarfiit A/S hvorfor projektet lukkes i 2024.
31066	Fornyelse af installationer i flere byer	897212	45.200	-41.642	Udførelse har haft en del opstartsudfordringer, herunder bl.a. manglende kapacitet pga. coronasmitte, strømsvigt, skader på rør, som er løst løbende. Fortsætter i Nuuk og Sisimiut + uddannelse samt udførelse i øvrige byer i 2024.
46021	Psykiatribygning i Nuuk	866001	42.500	-27.371	Revideret projekt af Ny Psykiatribygning, Nuuk genudbydes i 2024 som tidligt udbud i hovedentreprise, sammen med ambulancegarage og portørcenter. Opstart af byggeriet forventes primo 2025.
Hovedtotal			2.654.263	-2.361.816	

* Tabellen viser et overforbrug på projekt 61.003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik, på samlet 2,2 mio. kr. Omkostninger til byggeri af skibet er samlet 235 mio. kr., hvoraf Landskassens bevilling udgør 220 mio. kr. og hvor de resterende 15 mio. kr. er fondsmidler, som først indbetales når skibet er afleveret til Selvstyret. Der er således ikke tale om et reelt overforbrug i forhold til de samlede omkostninger.

** Tabellen viser et overforbrug på projekt 52.114 219 sengepladser, Nuuk, på samlet 48,7 mio. kr. Omkostning til byggeriet er samlet 215,2 mio. kr. i opførelsesperioden, hvor der i finansår 2024 og 2025 er afsat midler hertil. Tabellen indeholder alene opgørelse af bevilling ultimo 2023, hvorfor der ikke er tale om et reelt overforbrug. Disponering til kontrakter i BO-årene sker i henhold til Selvstyrets budgetregulativ bestemmelser.

*** Tabellen viser et overforbrug på projekt 39.041 Genhusning efter oversvømmelse, på samlet 29,4 mio. kr. Staten har i sin tid bevilget 30 mio. kr. til foranstaltninger som følge af tsunamien, som til dags dato ikke er overført til projektet. Denne rokering gennemføres i løbet af 2024, hvorfor projektets bevilling herefter vil stemme med forbruget.

**** Tabellen viser et overforbrug på projekt 52.115 74 sengepladser, Qaqortoq, på samlet 1,2 mio. kr. Der ses være fejl i bogførte poster, hvorfor dette gennemgås med henblik på rettelse i løbet af 2024. Projektets bevilling vil herefter stemme med forbruget.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti

Finanslov	Hovedprojekt id & Navn	Primo	Bevilling IÅ	Disponibel	Forbrug	Ultimo	Bevilling total	Forbrug total	Total disponeret	Total forbrug i %
011014	10019 Udvidelse af Landstingssal	-75		-75		-75	3.379	-3.454	-3.455	
011014	10053 Ny bygning til Inatsisatut	1.488		1.488		1.488	3.000	-1.512	-1.878	
011015	10049 22 mindre boliger til Inatsisartut	1.936		1.936	-2	1.934	6.000	-4.066	-4.296	-0 %
800001	80800 Omrokeringsreserve	64.627	-51.200	13.427	-1.576	11.851	13.427	-1.576		-12 %
800010	80801 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	2.513		2.513		2.513	0	2.513		
811002	10054 Selvstyrets Central Administration	1.300		1.300		1.300	1.300			
822002	90022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	5.522	2.000	7.522	-6.779	743	77.942	-77.199	-77.199	-90 %
822002	90028 Udvikling af ERP	3.000		3.000	-2.360	640	3.000	-2.360	-2.636	-79 %
822002	90029 Nyt Lånemodul		6.500	6.500	-1.407	5.093	6.500	-1.407	-1.500	-22 %
822003	40089 Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	-722		-722	-768	-1.490	11.000	-12.490	-12.559	106 %
822003	40094 Offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse		6.100	6.100	-2.220	3.880	6.100	-2.220	-4.501	-36 %
822401	90024 Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	2.933	7.700	10.633	-4.755	5.878	16.100	-10.222	-19.597	-45 %
822401	90025 Beskæftigelsesfradrag	4.916	-4.900	16		16	1.400	-1.384	-1.384	
822401	90027 Krops- og narkoskannere		4.000	4.000		4.000	4.000			
833012	44044 Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	1.742		1.742		1.742	13.575	-11.833	-13.581	
833012	44047 Alderdomshjem i Paamiut	2.231		2.231		2.231	27.500	-25.269	-27.500	
833012	44048 Pulje til nyanlæg og renovering	21.500	15.800	37.300		37.300	37.300			
833012	44049 Tilstandsregistrering af ældreområdet	0		0		0	0	0	-3.662	
833012	44051 Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	2.897		2.897		2.897	16.350	-13.453	-20.766	
833012	44053 Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	9.525		9.525	-6.381	3.144	18.000	-14.856	-18.000	-67 %
833012	44054 Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	3.867		3.867		3.867	16.400	-12.533	-16.400	
833012	44056 Demensafsnit på aldersomshjem, Sisimiut	-460		-460		-460		-460	-460	
833012	44057 Alderdomshjem, Ilulissat	2.000		2.000	-1.695	305	2.000	-1.695	-2.000	-85 %
833013	40047 Etabl. af et udslyningshjem f. unge mel. 18-23	0		0		0	0	0	-17.252	
833013	40054 Landsdækkende handicap træningscenter	0		0		0	55.033	-55.033	-58.138	
833013	40058 Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq	0		0		0	7.459	-7.459	-7.412	
833013	40062 Udredningshjem	0		0		0	8.271	-8.271	-8.789	

833013	40064 Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	-62	-3.300	-3.362	3.362	0	0	0	-3.392	-100 %
833013	40066 Opdeling af Aaaq i to institutioner	1.156	22.500	23.656	-5.119	18.536	24.500	-5.964	-43.788	-22 %
833013	40067 Pulje til nyanlæg og renovering	22.429	-22.500	-71		-71	20	-91	-91	
833013	40068 Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	0		0		0	2.224	-2.224	-2.225	
833013	40075 Lukket gårdmiljø til Isikkivik	0		0		0	12	-12	-822	
833013	40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	8.385		8.385	-4.243	4.142	65.020	-60.878	-61.244	-51 %
833013	40084 Genopførelse af udslusninghjem, Uummannaq	0		0		0	5.595	-5.595	-6.358	
833013	40086 Døgninstitution for børn med sindslidelser	5.253		5.253	-1.851	3.402	6.000	-2.598	-2.842	-35 %
833013	40090 Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	249		249	-28	222	7.000	-6.778	-6.907	-11 %
833013	40091 Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og renovering	24.328		24.328	-8.292	16.036	34.500	-18.464	-28.907	-34 %
833013	40092 Aktivitetshus til børn og unge, Kullorsuaq	9.000		9.000		9.000	9.000			
833014	40093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk	3.900		3.900		3.900	3.900			
844010	50069 Ren/ombygning udv. skole Qaqortoq	1		1		1	114.765	-114.764	-114.764	
844010	50083 Skole i Kangersuatsiaq	0		0		0		0	-16.321	
844010	50091 Skolen Aappilattoq	0		0		0	0	0	-17.637	
844010	50110 Skole, Narsaq	0		0		0	0	0	-78.646	
844010	50111 Ren./ombygning/udv. skole, Sarfannguit	0		0		0	8.986	-8.986	-9.517	
844010	50115 Ren./ombygning/udv. skole, Nuussuaq	1		1		1	9.029	-9.028	-9.031	
844010	50126 Udv./ren./ombygning af skole, Upv. Kujalleq	2.631		2.631		2.631	13.700	-11.069	-11.333	
844010	50128 Om- og tilbygning af Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisi	0		0		0	0	0	-26.000	
844010	50131 Ny skole i Ilulissat	0		0		0	192.454	-192.454	-195.481	
844010	50132 Diverse skole, nyanlæg og renovering	-7.254		-7.254		-7.254	-1.050	-6.204	-6.179	
844010	50133 Bygdeskole, Alluitsup Paa	-1.510	-27.850	-29.360	29.360	0	0	0	-29.818	-100 %
844012	51021 Projektplan for udflytning af udd. inst.	-1		-1		-1	2.829	-2.830	-2.830	
844012	51024 Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	9.431		9.431	-220	9.211	10.000	-789	-882	-2 %
844012	51026 Landbrugsskole i Upernaviarsuk	2.743		2.743	-122	2.620	3.000	-380	-667	-4 %
844012	52061 Udvidelse af GU, Aasiaat	0	-89.582	-89.582	89.582	0	0	0	-89.582	-100 %
844012	52086 Udvidelse af PISPS, Ilulissat	-1	-45.157	-45.158	45.158	0	0	0	-45.156	-100 %
844012	52087 Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	0	-103.929	-103.929	103.929	0	0	0	-104.680	-100 %
844012	52088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	-1	-13.049	-13.050	13.050	0	0	0	-13.050	-100 %

844012	52094 Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	-3.249		-3.249	-36	-3.285	19.691	-22.976	-22.890	1 %
844012	52095 Skolepraktikhaller og haller til ko	727		727	-20	707	36.500	-35.793	-35.846	-3 %
844012	52118 Diverse renovering	1.010	31.200	32.210	-19.733	12.477	62.400	-49.923	-64.546	-61 %
844012	52119 Tilstandsregistrering af uddannelsesbygninger	7.823		7.823	-228	7.595	8.000	-405	-405	-3 %
844014	54007 Tilskud til renovering af idrætshaller	8.178	900	9.078	-984	8.095	22.300	-14.205	-15.246	-11 %
844015	52060 Elevhjem i Nanortalik	0		0		0	0	0	-26.641	
844015	52071 Skolehjem med 50 værelser , Uummanaq	0	-32.472	-32.472	32.472	0	0	0	-32.587	-100 %
844015	52077 Kollegiebyggeri i Kujalerpaat, Nuuk 1. etape	0		0		0	0	0	-78.841	
844015	52091 Kollegiebyggeri i Paamiut	0		0		0	0	0	-15.820	
844015	52092 Etablering/renovering elevhjem Qassarsuk	5.048		5.048	-631	4.417	20.700	-16.283	-20.496	-13 %
844015	52101 Projektering af standardkollegier, 2015	0		0		0	2.382	-2.382	-2.382	
844015	52102 Projektering af standardkollegier	2.399	-7.100	-4.701	4.750	49	3.000	-2.951	-2.951	-101 %
844015	52111 32 sengepladser, Aasiaat	22.183	6.300	28.483	-20.361	8.123	56.100	-47.977	-51.857	-71 %
844015	52112 70 sengepladser, Ilulissat	21.667	6.300	27.967	-19.218	8.749	59.900	-51.151	-55.889	-69 %
844015	52113 72 sengepladser, Sisimiut	36.610	13.500	50.110	-20.150	29.961	87.850	-57.889	-83.708	-40 %
844015	52114 219 sengepladser, Nuuk	11.212	20.000	31.212	-79.864	-48.652	166.500	-215.152	-231.777	-256 %
844015	52115 74 sengepladser, Qaqortoq	9.509	2.100	11.609	-12.817	-1.207	66.950	-68.157	-69.979	-110 %
844015	52120 Standard Kollegier, Ilulissat, Etape 2		12.800	12.800	-1.365	11.435	12.800	-1.365	-11.264	-11 %
844015	52121 Standard Kollegier, Aasiaat, Etape 2		12.300	12.300	-3.194	9.106	12.300	-3.194	-10.813	-26 %
844015	52122 Standard Kollegier, Sisimiut, Etape 2		40.900	40.900	-9.849	31.051	40.900	-9.849	-37.528	-24 %
844015	52123 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2		6.100	6.100	-4.678	1.422	6.100	-4.678	-5.550	-77 %
844015	52124 Standard Kollegier, Qaqortoq, Etape 2		29.600	29.600	-7.230	22.370	29.600	-7.230	-19.168	-24 %
844017	41050 Daginstitution i Atammik, 2015	0		0		0	0	0	-2.400	
844501	58041 Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	0	-979	-979	979	0	0	0	-1.069	-100 %
844501	58046 Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	0	-373	-373	373	0	0	0	-373	-100 %
855020	72004 Etablering af Visitorcentre	9.898		9.898	-709	9.189	10.300	-1.111	-1.250	-7 %
855020	72010 Nuuk Natur- og geopark	9.750		9.750		9.750	9.750			
855020	72011 Nationale seværdigheder	-4.650		-4.650		-4.650	-4.650			
859001	61004 Anskaffelse af Fartøjer til GFLK	7.137		7.137	-5.308	1.829	6.500	-4.671	-5.889	-74 %
866001	46015 DIH 3. fløj, Nuuk	0		0		0	0	0	-33.925	

866001	46021 Psykiatribygning i Nuuk	852	18.400	19.252	-4.123	15.129	42.500	-27.371	-37.099	-21 %
866001	46023 Energoptimering DIH, Nuuk	1.039		1.039	-1.039	0	7.000	-7.000	-7.000	-100 %
866001	46027 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	0		0		0	2.279	-2.279	-2.279	
866001	46028 Patienthotel i Aasiaat	-1		-1		-1	17.956	-17.957	-17.640	
866001	46030 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	1		1		1	2.018	-2.017	-2.017	
866001	46031 Projektering af ny sengefløj og patienthotel	6.048	5.000	11.048	-639	10.409	13.000	-2.591	-3.474	-6 %
866001	46032 Rømning af byggegrund	3.000		3.000		3.000	3.000			
866001	46033 Steno Diabetes Center	-10.580		-10.580	5.323	-5.257		-5.257	-82.277	-50 %
866001	46034 Anskaffelser af ambulancer	3.595	2.500	6.095	-5.467	629	10.000	-9.371	-9.371	-90 %
866001	46035 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk	215		215		215	6.000	-5.786	-5.786	
866001	46037 Tilskud til Neriuffik	1.500		1.500	-1.324	176	1.500	-1.324	-1.324	-88 %
866001	47031 Udbygning DIH - fondsmidler	-136		-136		-136	53.428	-53.564	-193.660	
866001	47041 Ilt produktions anlæg i sygehuse	2.827		2.827		2.827	6.500	-3.673	-3.673	
866001	47042 Regionssygehus i Sisimiut	84.957		84.957	-23.086	61.872	113.800	-51.928	-70.183	-27 %
866001	47047 Børneafdeling på DIH, Nuuk	0		0		0	200	-200	-203	
866001	47051 Apparaturpuljen	32.388	11.500	43.888	-12.747	31.141	132.500	-101.359	-101.382	-29 %
866001	47053 Vedligeholdelseefterslæb	16.172	29.500	45.672	-59.544	-13.872	164.900	-178.772	-178.772	-130 %
866001	47055 Diverse nyanlæg og renovering	25.104	-18.400	6.704		6.704	6.850	-146	-149	
866001	48013 Centralklinik i Nuuk	6.426		6.426	-116	6.310	9.218	-2.908	-4.156	-2 %
866001	90030 Nyt EPJ-System		2.000	2.000		2.000	2.000			
870088	29107 Vej i Sydgrønland	0		0		0	28.004	-28.004	-28.093	
870088	29108 Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	4.498		4.498		4.498	5.000	-502	-4.902	
871106	73014 5-års eftersyn, 2019	0		0		0	197	-197	-372	
871106	73015 5-års eftersyn, 2020	1		1		1	295	-294	-314	
871106	73016 5-års eftersyn	664	500	1.164	-231	933	1.500	-567	-711	-20 %
871109	23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	15.992	-6.000	9.992	-1.296	8.695	59.735	-51.040	-53.299	-13 %
871109	23012 Infrastrukturanlæg i Sydgrønland		2.000	2.000		2.000	2.000			
871109	23013 Vækst- og udviklingsanalyse		6.000	6.000	-147	5.853	6.000	-147	-59	-2 %
871110	20077 Klimatilpasningsplan for byggeri og infrastruktur		1.000	1.000		1.000	1.000			
877210	30012 Personaleboliger i Nuuk	15.793	3.500	19.293	-446	18.847	29.000	-10.153	-12.235	-2 %

877213	97150 Renovering diverse steder, 2009	0		0		0	0	0	-18.436	
877213	97151 Renovering diverse steder, 2010	0		0		0	0	0	-3.337	
877213	97157 Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	6.769		6.769	-74	6.695	18.000	-11.305	-11.915	-1 %
877222	35024 Boligprg.f/bygder og yderd. 2014	0		0		0	0	0	-34.409	
877222	35025 Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	0		0		0	9.108	-9.108	-9.108	
877222	35026 Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	-6.236		-6.236		-6.236	18	-6.254	-6.273	
877222	36106 Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	0		0		0	2.633	-2.633	-2.633	
877222	39039 Aktivitetshus til Kullorsuaq	3.500		3.500		3.500	3.500		-3.500	
877312	24116 Reinvestering i havne og kajanlæg	23.796	25.200	48.996	-22.941	26.056	220.269	-194.213	-211.279	-47 %
877312	24122 Sektorplaner for havne	3.600	-3.600	0		0	100	-100	-104	
877312	24128 Diverse nyanlæg	40.718	-4.800	35.918		35.918	36.122	-204	-236	
877312	24129 Havn i Kangerlussuaq	3.633		3.633		3.633	4.000	-367	-459	
877312	24130 Læmole i Qaanaaq	0		0		0	33.935	-33.935	-33.813	
877312	24131 Havnefaciliteter i Uummannaq	4.332	-2.000	2.332	-191	2.141	32.100	-29.959	-32.456	-8 %
877312	24136 Etablering af anløbsfaciliteter	1.795		1.795	-440	1.356	4.150	-2.794	-2.947	-24 %
877312	24138 Havnefaciliteter i Aasiaat	2.500		2.500	-28	2.472	2.500	-28	-28	-1 %
877312	24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq	3.000		3.000	-90	2.910	3.000	-90	-90	-3 %
877312	24140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq	600		600	-418	182	600	-418	-938	-70 %
877312	24141 Havnefyr		10.400	10.400	-3.802	6.598	10.400	-3.802	-9.728	-37 %
877320	25196 Qeqertarsuaq	0		0		0	17	-17	-10	
877320	25201 Kangerlussuaq	849		849		849	1.000	-151	-151	
877320	25216 Tasiilaq, landingsbane	1.387		1.387	-1.406	-19	1.400	-1.419	-1.425	-101 %
877320	25217 Ittoqqortoormiit, landingsbane	587		587	-606	-19	600	-619	-625	-103 %
877322	25182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	-84		-84		-84	27.075	-27.160	-27.160	
877322	25183 Langsigtede investeringsbehov	9.170		9.170	-7.781	1.389	50.000	-48.611	-49.694	-85 %
877322	25193 Vej til lufthavn i Qaanaaq	1.200		1.200	-109	1.091	4.500	-3.409	-4.211	-9 %
877322	25206 Rullende materiel	0		0		0	11.405	-11.405	-11.100	
877322	25207 Helikopterflyvepladser	102		102		102	5.000	-4.898	-5.251	
877322	25208 Vejrobservationstjeneste til lufthavne	251		251	517	768	3.900	-3.132	-3.654	206 %
877322	25212 Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	34		34		34	5.900	-5.866	-5.900	

877322	25213 Hangar til helikopter	940		940	-20	920	26.000	-25.080	-26.000	-2 %
877322	25214 Hangar til Tasiilaq	3.870		3.870	-3.866	5	29.300	-29.295	-29.300	-100 %
877322	25215 Coating af banen i Kangerlussuaq	791		791	-661	130	6.800	-6.670	-6.800	-84 %
877501	61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	-2.240		-2.240		-2.240	220.000	-222.240	-222.256	
877503	74005 Tilskud til kommunale miljøanlæg	2.439		2.439		2.439	44.500	-42.061	-44.405	
877504	32148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk	1.600		1.600	-1.594	6	1.700	-1.694	-1.728	-100 %
897140	17780 Udlån til Nukissiorfiit, 2023		60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000		-100 %
897212	30014 Alsidige boliger 2015, Qaqortoq	-1		-1		-1	27.950	-27.951	-27.951	
897212	30015 Alsidige boliger 2015, Maniitsoq	-1		-1		-1	47.338	-47.339	-47.339	
897212	30017 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	2.656		2.656	-82	2.574	79.710	-77.136	-80.125	-3 %
897212	30019 Funktionelle boliger, Ilulissat	6.808		6.808	-4.591	2.217	62.200	-59.983	-62.606	-67 %
897212	30025 Nye boliger 2019, Qaqortoq	2.640		2.640	-3.157	-517	28.800	-29.317	-29.317	-120 %
897212	30026 Nye boliger 2019, Aasiaat	17.020	15.000	32.020	-21.238	10.783	56.900	-46.117	-51.403	-66 %
897212	30028 Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	483		483	-118	365	1.200	-835	-835	-24 %
897212	31029 Ekstra renovering og istandsættelse 2014	1		1		1	39.150	-39.149	-39.149	
897212	31030 Diverse nedrivning Qaqortoq	1.207	-800	407	-452	-45	21.500	-21.545	-21.369	-111 %
897212	31031 Diverse nedrivning Narsaq	5.141		5.141	-47	5.095	16.000	-10.905	-11.023	-1 %
897212	31032 Diverse nedrivning Paamiut	7.465	1.200	8.665	-206	8.459	31.700	-23.241	-21.954	-2 %
897212	31033 Diverse nedrivning Nuuk	64		64	-57	8	12.300	-12.292	-12.299	-88 %
897212	31034 Diverse nedrivning Maniitsoq	3.880	8.700	12.580	-164	12.416	26.200	-13.784	-13.793	-1 %
897212	31035 Diverse nedrivning Sisimiut	3.244	-2.200	1.044	-29	1.016	7.800	-6.784	-7.827	-3 %
897212	31036 Diverse nedrivning Aasiaat	1.554	-1.300	254	-84	170	4.494	-4.324	-4.573	-33 %
897212	31037 Skimmel renovering	5.165	8.500	13.665	-355	13.310	69.200	-55.890	-57.658	-3 %
897212	31040 Diverse nedrivning Nanortalik	771	-600	171	-47	124	2.900	-2.776	-2.898	-28 %
897212	31041 Diverse nedrivning Ilulissat	-59		-59	59	0	0	0	0	-100 %
897212	31042 Diverse nedrivning Qasigiannuit	3.313	-3.300	13	-47	-34	3.700	-3.734	-3.795	-360 %
897212	31043 Landsdækkende skimmelrenovering	5.202	1.000	6.202	-797	5.405	34.000	-28.595	-31.432	-13 %
897212	31045 Diverse nedrivning Ilulissat	4.039	-4.000	39	-107	-67	100	-167	-169	-272 %
897212	31046 Renovering af boliger, Aasiaat	-1		-1		-1	12.882	-12.883	-12.883	
897212	31048 Renovering af altangange og altaner, Nuuk	1.642		1.642	2.429	4.070	82.400	-78.330	-81.768	148 %

897212	31049 Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	131		131	-787	-656	11.100	-11.756	-12.165	-600 %
897212	31050 Renovering af altaner, Qaqortoq	3.848		3.848	-961	2.887	16.700	-13.813	-15.645	-25 %
897212	31051 Renovering af altaner, Paamiut	3.172		3.172	-2.703	469	11.400	-10.931	-10.933	-85 %
897212	31053 Renovering af altaner, Maniitsoq	2.830		2.830	-128	2.702	19.800	-17.098	-18.143	-5 %
897212	31055 Renovering af altaner, Sisimiut	4.622		4.622	-2.778	1.844	15.000	-13.156	-13.232	-60 %
897212	31058 Skimmel renovering, Qaqortoq	760	1.500	2.260	-3.083	-823	7.000	-7.823	-10.171	-136 %
897212	31059 Skimmel renovering, Maniitsoq	1.353	1.500	2.853	-160	2.693	7.000	-4.307	-4.311	-6 %
897212	31060 Skimmel renovering, Sisimiut	4.280	1.000	5.280	-7.402	-2.121	11.000	-13.121	-13.418	-140 %
897212	31062 Skimmel renovering, Aasiaat	1.461	1.500	2.961	-28	2.933	3.000	-67	-67	-1 %
897212	31063 Skimmel renovering, Ilulissat	4.909		4.909	-28	4.881	5.000	-119	-119	-1 %
897212	31064 Nedrivning af BSU-huse	6.085		6.085	-2.138	3.947	8.200	-4.253	-4.254	-35 %
897212	31065 Renovering af Eqalugalinnuguit, Nuuk	-1.456		-1.456	-294	-1.749	16.400	-18.149	-18.847	20 %
897212	31066 Fornyelse af installationer i flere byer	13.162		13.162	-9.604	3.558	45.200	-41.642	-46.404	-73 %
897212	32124 Boliger	6.360	-1.600	4.760	-171	4.589	29.940	-25.351	-29.327	-4 %
897212	32127 12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	-1		-1		-1	8.265	-8.266	-8.266	
897212	32128 12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	-1		-1		-1	8.577	-8.578	-8.578	
897212	32129 Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	12.033		12.033		12.033	26.700	-14.667	-26.712	
897212	32131 8 boliger, Qaanaaq 2014	0		0		0	0	0	-12.015	
897212	32132 12 boliger, Aasiaat 2014	0		0		0	0	0	-13.000	
897212	32133 24 boliger, Ilulissat 2014	17.913		17.913		17.913	18.000	-87	-122	
897212	32134 4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	0		0		0	20.729	-20.729	-20.729	
897212	32140 Ungdomsboliger - typehus	285		285	-83	201	2.300	-2.099	-2.421	-29 %
897212	32141 Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	1.825		1.825	-2.873	-1.047	16.100	-17.147	-17.671	-157 %
897212	32142 Ungdomsboliger, Tasiilaq	577	9.100	9.677	-6.701	2.976	10.433	-7.457	-10.637	-69 %
897212	32143 Ungdomsboliger, Upernavik	615	6.700	7.315	-2.344	4.971	8.033	-3.062	-6.711	-32 %
897212	32144 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit	700	4.600	5.300	-1.910	3.390	5.933	-2.543	-7.078	-36 %
897212	32145 Ungdomsboliger, Uummanaq	839	10.000	10.839	-5.363	5.476	11.333	-5.857	-9.208	-49 %
897212	32146 Ungdomsboliger, Kangaatsiaq	685	10.500	11.185	-4.436	6.749	11.834	-5.085	-9.278	-40 %
897212	32147 Ungdomsboliger, Ittoqqortoormiit	864	5.500	6.364	-4.118	2.246	6.834	-4.588	-5.614	-65 %
897212	32149 Ungdomsboliger, Qeqertarsuaq		1.500	1.500	-499	1.001	1.500	-499	-1.047	-33 %

897212	32150 Ungdomsboliger, Nanortalik		1.500	1.500	-449	1.051	1.500	-449	-1.023	-30 %
897212	32151 Ungdomsboliger, Nuussuaq		1.500	1.500	-297	1.203	1.500	-297	-524	-20 %
897212	32152 Ungdomsboliger, Kangaamiut				-263	-263		-263	-500	
897212	32154 Ungdomsboliger, Narsaq				-438	-438		-438	-1.000	
897212	32155 Ungdomsboliger, Upernavik Etape 2				-363	-363		-363	-700	
897212	34527 Diverse renovering og sanering	131.897	82.000	213.897	-71.076	142.821	470.355	-327.534	-390.156	-33 %
897212	34528 Genhusningcenter for lejere i Nuuk	0		0		0	0	0	-7.712	
897212	36101 Bygder- og yderdistrikter	0		0		0	0	0	-15.009	
897212	38018 Forundersøgelser i Qaanaaq	0		0		0	2.754	-2.754	-3.595	
897212	38019 Udvikling af Illorput 2023		2.000	2.000	-737	1.263	2.000	-737	-1.637	-37 %
897212	39041 Genhusning efter oversvømmelse	-29.428		-29.428	36	-29.392	81.554	-110.946	-110.644	-0 %
897212	39043 Opførelse af boliger, Qaarsut	1.302		1.302	-110	1.192	23.100	-21.908	-22.915	-8 %
Total		939.785	147.909	1.087.694	-300.945	786.749	4.823.803	-4.188.809	-5.367.698	-28 %

Bilag 2: Projektstatus

Projektstadi	Projekt id & Navn	Finanslov	Primo	Bevilling i Å	Disponibel	Forbrug	Ultimo	Total bev Ultimo	Total forbrug	Total disp
Til intern revision	10019 Udvidelse af Landstingssal	011014	-75		-75		-75	3.379	-3.454	-3.455
Til intern revision	10053 Ny bygning til Inatsisatut	011014	1.488		1.488		1.488	3.000	-1.512	-1.878
Til intern revision	44044 Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	833012	1.742		1.742		1.742	13.575	-11.833	-13.581
Til intern revision	44047 Alderdomshjem i Paamiut	833012	2.231		2.231		2.231	27.500	-25.269	-27.500
Til intern revision	40054 Landsdækkende handicap træningscenter	833013	0		0		0	55.033	-55.033	-58.138
Til intern revision	40058 Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq	833013	0		0		0	7.459	-7.459	-7.412
Til intern revision	40062 Udredningshjem	833013	0		0		0	8.271	-8.271	-8.789
Til intern revision	40068 Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	833013	0		0		0	2.224	-2.224	-2.225
Til intern revision	40075 Lukket gårdmiljø til Isikkivik	833013	0		0		0	12	-12	-822
Til intern revision	40084 Genopførelse af udslusninghjem, Uummannaq	833013	0		0		0	5.595	-5.595	-6.358
Til intern revision	50069 Ren/ombygn.udv. skole Qaqortoq	844010	1		1		1	114.765	-114.764	-114.764
Til intern revision	50111 Ren./ombygn./udv. skole, Sarfannguit	844010	0		0		0	8.986	-8.986	-9.517
Til intern revision	50115 Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq	844010	1		1		1	9.029	-9.028	-9.031
Til intern revision	50126 Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	844010	2.631		2.631		2.631	13.700	-11.069	-11.333
Til intern revision	50131 Ny skole i Ilulissat	844010	0		0		0	192.454	-192.454	-195.481
Til intern revision	50132 Diverse skole, nyanlæg og renovering	844010	-7.254		-7.254		-7.254	-1.050	-6.204	-6.179
Til intern revision	51021 Projektplan for udflytning af udd. inst.	844012	-1		-1		-1	2.829	-2.830	-2.830
Til intern revision	52095 Skolepraktikhaller og haller til ko	844012	727		727	-20	707	36.500	-35.793	-35.846
Til intern revision	52101 Projektering af standardkollegier, 2015	844015	0		0		0	2.382	-2.382	-2.382
Til intern revision	72011 Nationale seværdigheder	855020	-4.650		-4.650		-4.650	-4.650		
Til intern revision	46027 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	866001	0		0		0	2.279	-2.279	-2.279
Til intern revision	46028 Patienthotel i Aasiaat	866001	-1		-1		-1	17.956	-17.957	-17.640
Til intern revision	46030 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	866001	1		1		1	2.018	-2.017	-2.017
Til intern revision	46035 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk	866001	215		215		215	6.000	-5.786	-5.786
Til intern revision	47031 Udbygning DIH - fondsmidler	866001	-136		-136		-136	53.428	-53.564	-193.660
Til intern revision	47047 Børneafdeling på DIH, Nuuk	866001	0		0		0	200	-200	-203
Til intern revision	29107 Vej i Sydgrønland	870088	0		0		0	28.004	-28.004	-28.093
Til intern revision	73014 5-års eftersyn, 2019	871106	0		0		0	197	-197	-372

Til intern revision	73015 5-års eftersyn, 2020	871106	1		1		1	295	-294	-314
Til intern revision	35025 Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	877222	0		0		0	9.108	-9.108	-9.108
Til intern revision	35026 Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	877222	-6.236		-6.236		-6.236	18	-6.254	-6.273
Til intern revision	36106 Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	877222	0		0		0	2.633	-2.633	-2.633
Til intern revision	24122 Sektorplaner for havne	877312	3.600	-3.600	0		0	100	-100	-104
Til intern revision	24130 Læmole i Qaanaaq	877312	0		0		0	33.935	-33.935	-33.813
Til intern revision	25196 Qeqertarsuaq	877320	0		0		0	17	-17	-10
Til intern revision	25182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	877322	-84		-84		-84	27.075	-27.160	-27.160
Til intern revision	25206 Rullende materiel	877322	0		0		0	11.405	-11.405	-11.100
Til intern revision	25207 Helikopterflyvepladser	877322	102		102		102	5.000	-4.898	-5.251
Til intern revision	74005 Tilskud til kommunale miljøanlæg	877503	2.439		2.439		2.439	44.500	-42.061	-44.405
Til intern revision	17780 Udlån til Nukissiorfiit, 2023	897140		60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	
Til intern revision	30014 Alsidige boliger 2015, Qaqortoq	897212	-1		-1		-1	27.950	-27.951	-27.951
Til intern revision	30015 Alsidige boliger 2015, Maniitsoq	897212	-1		-1		-1	47.338	-47.339	-47.339
Til intern revision	30025 Nye boliger 2019, Qaqortoq	897212	2.640		2.640	-3.157	-517	28.800	-29.317	-29.317
Til intern revision	31029 Ekstra renovering og istandsættelse 2014	897212	1		1		1	39.150	-39.149	-39.149
Til intern revision	31030 Diverse nedrivning Qaqortoq	897212	1.207	-800	407	-452	-45	21.500	-21.545	-21.369
Til intern revision	31035 Diverse nedrivning Sisimiut	897212	3.244	-2.200	1.044	-29	1.016	7.800	-6.784	-7.827
Til intern revision	31036 Diverse nedrivning Aasiaat	897212	1.554	-1.300	254	-84	170	4.494	-4.324	-4.573
Til intern revision	31040 Diverse nedrivning Nanortalik	897212	771	-600	171	-47	124	2.900	-2.776	-2.898
Til intern revision	31041 Diverse nedrivning Ilulissat	897212	-59		-59	59	0		0	0
Til intern revision	31042 Diverse nedrivning Qasigiannuguit	897212	3.313	-3.300	13	-47	-34	3.700	-3.734	-3.795
Til intern revision	31045 Diverse nedrivning Ilulissat	897212	4.039	-4.000	39	-107	-67	100	-167	-169
Til intern revision	31046 Renovering af boliger, Aasiaat	897212	-1		-1		-1	12.882	-12.883	-12.883
Til intern revision	32127 12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	897212	-1		-1		-1	8.265	-8.266	-8.266
Til intern revision	32128 12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	897212	-1		-1		-1	8.577	-8.578	-8.578
Til intern revision	32129 Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	897212	12.033		12.033		12.033	26.700	-14.667	-26.712
Til intern revision	32134 4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	897212	0		0		0	20.729	-20.729	-20.729
Til intern revision	38018 Forundersøgelser i Qaanaaq	897212	0		0		0	2.754	-2.754	-3.595
Lukket	44049 Tilstandsregistrering af ældreområdet	833012	0		0		0	0	0	-3.662

Lukket	40047 Etabl. af et udslusningshjem f. unge mel. 18-23	833013	0		0		0	0	0	-17.252
Lukket	40064 Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	833013	-62	-3.300	-3.362	3.362	0	0	0	-3.392
Lukket	50083 Skole i Kangersuatsiaq	844010	0		0		0		0	-16.321
Lukket	50091 Skolen Aappilattoq	844010	0		0		0	0	0	-17.637
Lukket	50110 Skole, Narsaq	844010	0		0		0	0	0	-78.646
Lukket	50128 Om- og tilbygning af Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisi	844010	0		0		0	0	0	-26.000
Lukket	50133 Bygdeskole, Alluitsup Paa	844010	-1.510	-27.850	-29.360	29.360	0	0	0	-29.818
Lukket	52061 Udvidelse af GU, Aasiaat	844012	0	-89.582	-89.582	89.582	0	0	0	-89.582
Lukket	52086 Udvidelse af PISPS, Ilulissat	844012	-1	-45.157	-45.158	45.158	0	0	0	-45.156
Lukket	52087 Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	844012	0	-103.929	-103.929	103.929	0	0	0	-104.680
Lukket	52088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	844012	-1	-13.049	-13.050	13.050	0	0	0	-13.050
Lukket	52060 Elevhjem i Nanortalik	844015	0		0		0	0	0	-26.641
Lukket	52071 Skolehjem med 50 værelser , Uummanaq	844015	0	-32.472	-32.472	32.472	0	0	0	-32.587
Lukket	52077 Kollegiebyggeri i Kujalerpaat, Nuuk 1. etape	844015	0		0		0	0	0	-78.841
Lukket	52091 Kollegibyggeri i Paamiut	844015	0		0		0	0	0	-15.820
Lukket	41050 Daginstitution i Atammik, 2015	844017	0		0		0	0	0	-2.400
Lukket	58041 Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	844501	0	-979	-979	979	0	0	0	-1.069
Lukket	58046 Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	844501	0	-373	-373	373	0	0	0	-373
Lukket	46015 DIH 3. fløj, Nuuk	866001	0		0		0	0	0	-33.925
Lukket	97150 Renovering diverse steder, 2009	877213	0		0		0	0	0	-18.436
Lukket	97151 Renovering diverse steder, 2010	877213	0		0		0	0	0	-3.337
Lukket	35024 Boligprg.f/bygder og yderd. 2014	877222	0		0		0	0	0	-34.409
Lukket	32131 8 boliger, Qaanaaq 2014	897212	0		0		0	0	0	-12.015
Lukket	32132 12 boliger, Aasiaat 2014	897212	0		0		0	0	0	-13.000
Lukket	34528 Genhusningcenter for lejere i Nuuk	897212	0		0		0	0	0	-7.712
Lukket	36101 Bygder- og yderdistrikter	897212	0		0		0	0	0	-15.009
Igangværende	10049 22 mindre boliger til Inatsisartut	011015	1.936		1.936	-2	1.934	6.000	-4.066	-4.296
Igangværende	80800 Omrokeringsreserve	800001	64.627	-51.200	13.427	-1.576	11.851	13.427	-1.576	
Igangværende	80801 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	800010	2.513		2.513		2.513	0	2.513	
Igangværende	10054 Selvstyrets Central Administration	811002	1.300		1.300		1.300	1.300		

Igangværende	90022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	5.522	2.000	7.522	-6.779	743	77.942	-77.199	-77.199
Igangværende	90028 Udvikling af ERP	822002	3.000		3.000	-2.360	640	3.000	-2.360	-2.636
Igangværende	90029 Nyt Lånemodul	822002		6.500	6.500	-1.407	5.093	6.500	-1.407	-1.500
Igangværende	40089 Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	822003	-722		-722	-768	-1.490	11.000	-12.490	-12.559
Igangværende	40094 Offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse	822003		6.100	6.100	-2.220	3.880	6.100	-2.220	-4.501
Igangværende	90024 Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	822401	2.933	7.700	10.633	-4.755	5.878	16.100	-10.222	-19.597
Igangværende	90025 Beskæftigelsesfradrag	822401	4.916	-4.900	16		16	1.400	-1.384	-1.384
Igangværende	90027 Krops- og narkoskannere	822401		4.000	4.000		4.000	4.000		
Igangværende	44048 Pulje til nyanlæg og renovering	833012	21.500	15.800	37.300		37.300	37.300		
Igangværende	44051 Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	833012	2.897		2.897		2.897	16.350	-13.453	-20.766
Igangværende	44053 Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	833012	9.525		9.525	-6.381	3.144	18.000	-14.856	-18.000
Igangværende	44054 Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	833012	3.867		3.867		3.867	16.400	-12.533	-16.400
Igangværende	44056 Demensafsnit på aldersomshjem, Sisimiut	833012	-460		-460		-460		-460	-460
Igangværende	44057 Alderdomshjem, Ilulissat	833012	2.000		2.000	-1.695	305	2.000	-1.695	-2.000
Igangværende	40066 Opdeling af Aaqa i to institutioner	833013	1.156	22.500	23.656	-5.119	18.536	24.500	-5.964	-43.788
Igangværende	40067 Pulje til nyanlæg og renovering	833013	22.429	-22.500	-71		-71	20	-91	-91
Igangværende	40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	8.385		8.385	-4.243	4.142	65.020	-60.878	-61.244
Igangværende	40086 Døgninstitution for børn med sindslidelser	833013	5.253		5.253	-1.851	3.402	6.000	-2.598	-2.842
Igangværende	40090 Etablering af satellitafdeling til Pilutaaq	833013	249		249	-28	222	7.000	-6.778	-6.907
Igangværende	40091 Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og renovering	833013	24.328		24.328	-8.292	16.036	34.500	-18.464	-28.907
Igangværende	40092 Aktivitetshus til børn og unge, Kullorsuaq	833013	9.000		9.000		9.000	9.000		
Igangværende	40093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk	833014	3.900		3.900		3.900	3.900		
Igangværende	51024 Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	844012	9.431		9.431	-220	9.211	10.000	-789	-882
Igangværende	51026 Landbrugsskole i Upernavisuk	844012	2.743		2.743	-122	2.620	3.000	-380	-667
Igangværende	52094 Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	844012	-3.249		-3.249	-36	-3.285	19.691	-22.976	-22.890
Igangværende	52118 Diverse renovering	844012	1.010	31.200	32.210	-19.733	12.477	62.400	-49.923	-64.546
Igangværende	52119 Tilstandsregistrering af uddannelsesbygninger	844012	7.823		7.823	-228	7.595	8.000	-405	-405
Igangværende	54007 Tilskud til renovering af idrætshaller	844014	8.178	900	9.078	-984	8.095	22.300	-14.205	-15.246
Igangværende	52092 Etablering/renovering elevhjem Qassiarsuk	844015	5.048		5.048	-631	4.417	20.700	-16.283	-20.496
Igangværende	52102 Projektering af standardkollegier	844015	2.399	-7.100	-4.701	4.750	49	3.000	-2.951	-2.951

Igangværende	52111 32 sengepladser, Aasiaat	844015	22.183	6.300	28.483	-20.361	8.123	56.100	-47.977	-51.857
Igangværende	52112 70 sengepladser, Ilulissat	844015	21.667	6.300	27.967	-19.218	8.749	59.900	-51.151	-55.889
Igangværende	52113 72 sengepladser, Sisimiut	844015	36.610	13.500	50.110	-20.150	29.961	87.850	-57.889	-83.708
Igangværende	52114 219 sengepladser, Nuuk	844015	11.212	20.000	31.212	-79.864	-48.652	166.500	-215.152	-231.777
Igangværende	52115 74 sengepladser, Qaqortoq	844015	9.509	2.100	11.609	-12.817	-1.207	66.950	-68.157	-69.979
Igangværende	52120 Standard Kollegier, Ilulissat, Etape 2	844015		12.800	12.800	-1.365	11.435	12.800	-1.365	-11.264
Igangværende	52121 Standard Kollegier, Aasiaat, Etape 2	844015		12.300	12.300	-3.194	9.106	12.300	-3.194	-10.813
Igangværende	52122 Standard Kollegier, Sisimiut, Etape 2	844015		40.900	40.900	-9.849	31.051	40.900	-9.849	-37.528
Igangværende	52123 Standard Kollegier, Nuuk, Etape 2	844015		6.100	6.100	-4.678	1.422	6.100	-4.678	-5.550
Igangværende	52124 Standard Kollegier, Qaqortoq, Etape 2	844015		29.600	29.600	-7.230	22.370	29.600	-7.230	-19.168
Igangværende	72004 Etablering af Visitorcentre	855020	9.898		9.898	-709	9.189	10.300	-1.111	-1.250
Igangværende	72010 Nuuk Natur- og geopark	855020	9.750		9.750		9.750	9.750		
Igangværende	61004 Anskaffelse af Fartøjer til GFLK	859001	7.137		7.137	-5.308	1.829	6.500	-4.671	-5.889
Igangværende	46021 Psykiatrybygning i Nuuk	866001	852	18.400	19.252	-4.123	15.129	42.500	-27.371	-37.099
Igangværende	46023 Energoptimering DIH, Nuuk	866001	1.039		1.039	-1.039	0	7.000	-7.000	-7.000
Igangværende	46031 Projektering af ny sengeføj og patienthotel	866001	6.048	5.000	11.048	-639	10.409	13.000	-2.591	-3.474
Igangværende	46032 Rømning af byggegrund	866001	3.000		3.000		3.000	3.000		
Igangværende	46033 Steno Diabetes Center	866001	-10.580		-10.580	5.323	-5.257		-5.257	-82.277
Igangværende	46034 Anskaffelser af ambulancer	866001	3.595	2.500	6.095	-5.467	629	10.000	-9.371	-9.371
Igangværende	46037 Tilskud til Neriuffik	866001	1.500		1.500	-1.324	176	1.500	-1.324	-1.324
Igangværende	47041 Ilt produktions anlæg i sygehuse	866001	2.827		2.827		2.827	6.500	-3.673	-3.673
Igangværende	47042 Regionssygehus i Sisimiut	866001	84.957		84.957	-23.086	61.872	113.800	-51.928	-70.183
Igangværende	47051 Apparaturløbet	866001	32.388	11.500	43.888	-12.747	31.141	132.500	-101.359	-101.382
Igangværende	47053 Vedligeholdelseefterslæb	866001	16.172	29.500	45.672	-59.544	-13.872	164.900	-178.772	-178.772
Igangværende	47055 Diverse nyanlæg og renovering	866001	25.104	-18.400	6.704		6.704	6.850	-146	-149
Igangværende	48013 Centralklinik i Nuuk	866001	6.426		6.426	-116	6.310	9.218	-2.908	-4.156
Igangværende	90030 Nyt EPJ-System	866001		2.000	2.000		2.000	2.000		
Igangværende	29108 Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	870088	4.498		4.498		4.498	5.000	-502	-4.902
Igangværende	73016 5-års eftersyn	871106	664	500	1.164	-231	933	1.500	-567	-711
Igangværende	23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	15.992	-6.000	9.992	-1.296	8.695	59.735	-51.040	-53.299

Igangværende	23012 Infrastrukturanlæg i Sydgrønland	871109		2.000	2.000		2.000	2.000		
Igangværende	23013 Vækst- og udviklingsanalyse	871109		6.000	6.000	-147	5.853	6.000	-147	-59
Igangværende	20077 Klimatilpasningsplan for byggeri og infrastruktur	871110		1.000	1.000		1.000	1.000		
Igangværende	30012 Personaleboliger i Nuuk	877210	15.793	3.500	19.293	-446	18.847	29.000	-10.153	-12.235
Igangværende	97157 Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	877213	6.769		6.769	-74	6.695	18.000	-11.305	-11.915
Igangværende	39039 Aktivitetshus til Kullorsuaq	877222	3.500		3.500		3.500	3.500		-3.500
Igangværende	24116 Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	23.796	25.200	48.996	-22.941	26.056	220.269	-194.213	-211.279
Igangværende	24128 Diverse nyanlæg	877312	40.718	-4.800	35.918		35.918	36.122	-204	-236
Igangværende	24129 Havn i Kangerlussuaq	877312	3.633		3.633		3.633	4.000	-367	-459
Igangværende	24131 Havnefaciliteter i Uummanaq	877312	4.332	-2.000	2.332	-191	2.141	32.100	-29.959	-32.456
Igangværende	24136 Etablering af anløbsfaciliteter	877312	1.795		1.795	-440	1.356	4.150	-2.794	-2.947
Igangværende	24138 Havnefaciliteter i Aasiaat	877312	2.500		2.500	-28	2.472	2.500	-28	-28
Igangværende	24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq	877312	3.000		3.000	-90	2.910	3.000	-90	-90
Igangværende	24140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq	877312	600		600	-418	182	600	-418	-938
Igangværende	24141 Havnefyrr	877312		10.400	10.400	-3.802	6.598	10.400	-3.802	-9.728
Igangværende	25201 Kangerlussuaq	877320	849		849		849	1.000	-151	-151
Igangværende	25216 Tasiilaq, landingsbane	877320	1.387		1.387	-1.406	-19	1.400	-1.419	-1.425
Igangværende	25217 Ittoqqortoormiit, landingsbane	877320	587		587	-606	-19	600	-619	-625
Igangværende	25183 Langsigtede investeringsbehov	877322	9.170		9.170	-7.781	1.389	50.000	-48.611	-49.694
Igangværende	25193 Vej til lufthavn i Qaanaaq	877322	1.200		1.200	-109	1.091	4.500	-3.409	-4.211
Igangværende	25208 Vejrobservationstjeneste til lufthavne	877322	251		251	517	768	3.900	-3.132	-3.654
Igangværende	25212 Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	877322	34		34		34	5.900	-5.866	-5.900
Igangværende	25213 Hangar til helikopter	877322	940		940	-20	920	26.000	-25.080	-26.000
Igangværende	25214 Hangar til Tasiilaq	877322	3.870		3.870	-3.866	5	29.300	-29.295	-29.300
Igangværende	25215 Coating af banen i Kangerlussuaq	877322	791		791	-661	130	6.800	-6.670	-6.800
Igangværende	61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	-2.240		-2.240		-2.240	220.000	-222.240	-222.256
Igangværende	32148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk	877504	1.600		1.600	-1.594	6	1.700	-1.694	-1.728
Igangværende	30017 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	2.656		2.656	-82	2.574	79.710	-77.136	-80.125
Igangværende	30019 Funktionelle boliger, Ilulissat	897212	6.808		6.808	-4.591	2.217	62.200	-59.983	-62.606
Igangværende	30026 Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	17.020	15.000	32.020	-21.238	10.783	56.900	-46.117	-51.403

Igangværende	30028 Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	897212	483		483	-118	365	1.200	-835	-835
Igangværende	31031 Diverse nedrivning Narsaq	897212	5.141		5.141	-47	5.095	16.000	-10.905	-11.023
Igangværende	31032 Diverse nedrivning Paamiut	897212	7.465	1.200	8.665	-206	8.459	31.700	-23.241	-21.954
Igangværende	31033 Diverse nedrivning Nuuk	897212	64		64	-57	8	12.300	-12.292	-12.299
Igangværende	31034 Diverse nedrivning Maniitsoq	897212	3.880	8.700	12.580	-164	12.416	26.200	-13.784	-13.793
Igangværende	31037 Skimmel reovering	897212	5.165	8.500	13.665	-355	13.310	69.200	-55.890	-57.658
Igangværende	31043 Landsdækkende skimmelreovering	897212	5.202	1.000	6.202	-797	5.405	34.000	-28.595	-31.432
Igangværende	31048 Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	1.642		1.642	2.429	4.070	82.400	-78.330	-81.768
Igangværende	31049 Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	897212	131		131	-787	-656	11.100	-11.756	-12.165
Igangværende	31050 Renovering af altaner, Qaqortoq	897212	3.848		3.848	-961	2.887	16.700	-13.813	-15.645
Igangværende	31051 Renovering af altaner, Paamiut	897212	3.172		3.172	-2.703	469	11.400	-10.931	-10.933
Igangværende	31053 Renovering af altaner, Maniitsoq	897212	2.830		2.830	-128	2.702	19.800	-17.098	-18.143
Igangværende	31055 Renovering af altaner, Sisimiut	897212	4.622		4.622	-2.778	1.844	15.000	-13.156	-13.232
Igangværende	31058 Skimmel reovering, Qaqortoq	897212	760	1.500	2.260	-3.083	-823	7.000	-7.823	-10.171
Igangværende	31059 Skimmel reovering, Maniitsoq	897212	1.353	1.500	2.853	-160	2.693	7.000	-4.307	-4.311
Igangværende	31060 Skimmel reovering, Sisimiut	897212	4.280	1.000	5.280	-7.402	-2.121	11.000	-13.121	-13.418
Igangværende	31062 Skimmel reovering, Aasiaat	897212	1.461	1.500	2.961	-28	2.933	3.000	-67	-67
Igangværende	31063 Skimmel reovering, Ilulissat	897212	4.909		4.909	-28	4.881	5.000	-119	-119
Igangværende	31064 Nedrivning af BSU-huse	897212	6.085		6.085	-2.138	3.947	8.200	-4.253	-4.254
Igangværende	31065 Renovering af Eqalugalinnuguit, Nuuk	897212	-1.456		-1.456	-294	-1.749	16.400	-18.149	-18.847
Igangværende	31066 Fornyelse af installationer i flere byer	897212	13.162		13.162	-9.604	3.558	45.200	-41.642	-46.404
Igangværende	32124 Boliger	897212	6.360	-1.600	4.760	-171	4.589	29.940	-25.351	-29.327
Igangværende	32133 24 boliger, Ilulissat 2014	897212	17.913		17.913		17.913	18.000	-87	-122
Igangværende	32140 Ungdomsboliger - typehus	897212	285		285	-83	201	2.300	-2.099	-2.421
Igangværende	32141 Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	897212	1.825		1.825	-2.873	-1.047	16.100	-17.147	-17.671
Igangværende	32142 Ungdomsboliger, Tasiilaq	897212	577	9.100	9.677	-6.701	2.976	10.433	-7.457	-10.637
Igangværende	32143 Ungdomsboliger, Upernavik	897212	615	6.700	7.315	-2.344	4.971	8.033	-3.062	-6.711
Igangværende	32144 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit	897212	700	4.600	5.300	-1.910	3.390	5.933	-2.543	-7.078
Igangværende	32145 Ungdomsboliger, Uummanaaq	897212	839	10.000	10.839	-5.363	5.476	11.333	-5.857	-9.208
Igangværende	32146 Ungdomsboliger, Kangaatsiaq	897212	685	10.500	11.185	-4.436	6.749	11.834	-5.085	-9.278

Igangværende	32147 Ungdomsboliger, Ittoqqortoormiit	897212	864	5.500	6.364	-4.118	2.246	6.834	-4.588	-5.614
Igangværende	32149 Ungdomsboliger, Qeqertarsuaq	897212		1.500	1.500	-499	1.001	1.500	-499	-1.047
Igangværende	32150 Ungdomsboliger, Nanortalik	897212		1.500	1.500	-449	1.051	1.500	-449	-1.023
Igangværende	32151 Ungdomsboliger, Nuussuaq	897212		1.500	1.500	-297	1.203	1.500	-297	-524
Igangværende	32152 Ungdomsboliger, Kangaamiut	897212				-263	-263		-263	-500
Igangværende	32154 Ungdomsboliger, Narsaq	897212				-438	-438		-438	-1.000
Igangværende	32155 Ungdomsboliger, Upernavik Etape 2	897212				-363	-363		-363	-700
Igangværende	34527 Diverse renovering og sanering	897212	131.897	82.000	213.897	-71.076	142.821	470.355	-327.534	-390.156
Igangværende	38019 Udvikling af Illorput 2023	897212		2.000	2.000	-737	1.263	2.000	-737	-1.637
Igangværende	39041 Genhusning efter oversvømmelse	897212	-29.428		-29.428	36	-29.392	81.554	-110.946	-110.644
Igangværende	39043 Opførelse af boliger, Qaarsut	897212	1.302		1.302	-110	1.192	23.100	-21.908	-22.915
Total			939.785	147.909	1.087.694	-300.945	786.749	4.975.558	-4.188.809	-5.367.698

Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

(Ændret metode for opgørelse af budgetstillingen, engangstilladelse til regulering af egenkapitalen og præcisering af reglerne om fælles offentlige IT-systemer)

Kapitel 4

Finanslov, årsbudget m.v.

Anlæg, renovering m.v.

” § 14. Anlægs- og renoveringsfonden er en budget- og regnskabsteknisk fond, som indgår i landskassen.

Stk. 2. I Anlægs- og renoveringsfonden indtægtsføres finanslovens anlægsbevillinger. Dette gælder også anlægsbevillinger, som senere er godkendt af Inatsisartuts finansudvalg, og bevillinger, som måtte være afsat i medfør af § 13, stk. 4.

Stk. 3. Anlægsprojekternes udgifter udgiftsføres i Anlægs- og renoveringsfonden.

Stk. 4. Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i Anlægs- og renoveringsfonden.

Stk. 5. Mindreudgifter på det enkelte anlægsprojekts bevilgede totaludgift tilbageføres til Landskassen, når projektet er afsluttet.

§ 15. Den Naalakkersuisoq, som efter formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, fastsætter budget- og bevillingsmæssige bestemmelser for Anlægs- og renoveringsfondens virksomhed.

§ 16. Den Naalakkersuisoq, som efter formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, forestår den løbende administration af Anlægs- og renoveringsfonden.

§ 17. Naalakkersuisut udarbejder en årlig redegørelse til Inatsisartut om Anlægs- og renoveringsfondens aktivitet, herunder en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.

Stk. 2. Redegørelsen opdeles på projekttyper og projektgrupper og således, at der skelnes mellem bevillinger afsat til nyanskaffelse og bevillinger til vedligeholdelse og renovering.”
